



МИРГОРОДСЬКА МІСЬКА
РАДА
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

(сімдесят восьма сесія восьмого скликання)



РІШЕННЯ

від 19 серпня 2026 року

№ 275

Про затвердження проміжного моніторингового звіту про впровадження Плану дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату Миргородської міської територіальної громади до 2030 року за період 2021 – 2025 роки

Керуючись ст. 26 та ст. 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", з метою виконання зобов'язань в рамках співпраці з Європейською ініціативою «Угода Мерів щодо Клімату та Енергії» щодо проведення моніторингу та надання звіту з реалізації заходів передбачених Планом дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату Миргородської міської територіальної громади до 2030 року, затвердженого рішенням 14 сесії восьмого скликання від 24 грудня 2021 року №521 «Про затвердження Плану дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату Миргородської міської територіальної громади до 2030 року», міська рада

в и р і ш и л а:

1. Затвердити проміжний моніторинговий звіт про впровадження Плану дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату Миргородської міської територіальної громади до 2030 року за період 2021 – 2025 роки (додається).
2. Доручити відділу стратегічного планування, інвестиційної політики та енергоменеджменту управління економічного розвитку та інвестицій (Рубан І.В.) подати проміжний моніторинговий звіт про реалізацію Плану дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату Миргородської міської територіальної громади до 2030 року за період 2021 – 2025 роки до Європейської Комісії.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії міської ради з питань бюджету, економіко-інвестиційного планування, підприємництва, промисловості та розвитку сільських територій (Серов В.В.), з питань житлово-комунального господарства, просторового планування, містобудування та комунальних ресурсів (Золотарьова Л.А.).

Міський голова



Сергій СОЛОМАХА

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

19 SEP 2026

В.О. начальника відділу документообігу
та діловодства / Олексій БЛИСКАВКА


Додаток
до рішення сіддесят восьмої
сесії міської ради восьмого
скликання від 19 серпня
2026 року № 275



Covenant of Mayors
for Climate & Energy
in Ukraine

Проміжний моніторинговий звіт

впровадження Плану дій сталого енергетичного розвитку та клімату
Миргородської міської територіальної громади до 2030 року за період
2021-2025 роки

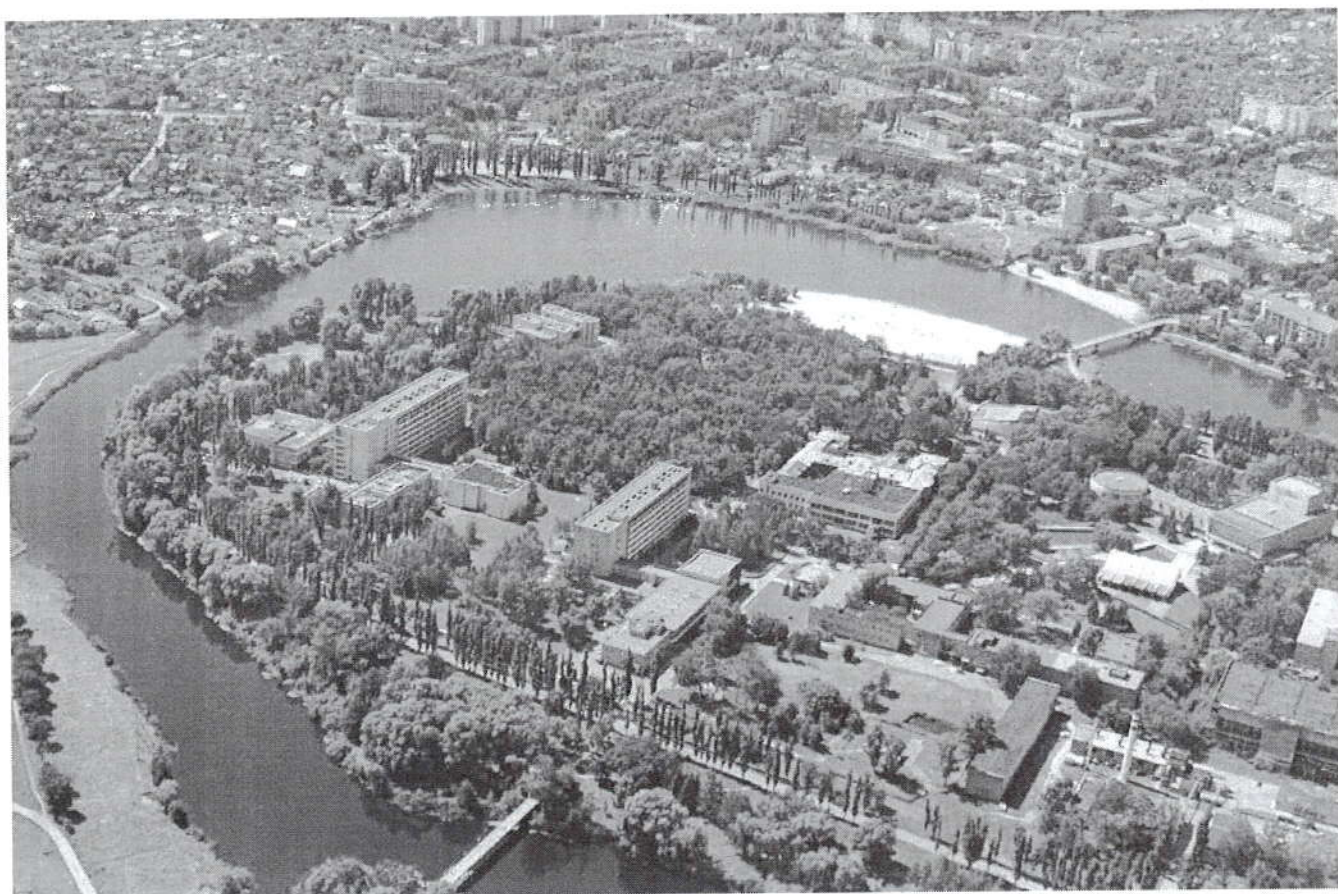

Зміст

<u>Пояснювальна записка до звіту</u>	3
<u>I. Моніторинговий кадастр викидів</u>	4
<u>II. Опис реалізованих заходів</u>	6

Пояснювальна записка до звіту

Розуміючи важливість проблем громади у сфері енергетики, 29 жовтня 2021 року Миргородська міська рада прийняла рішення сесії та долучилася до Європейської ініціативи Угода Мерів щодо Клімату та Енергії.

У 2021 році громада провела інвентаризацію базового рівня викидів парникових газів на своїй території та розпочало підготовку Плану дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату Миргородської міської територіальної громади до 2030 року (надалі «План дій»).

24 грудня 2021 року на чотирнадцятій сесії восьмого скликання Миргородська міська рада схвалила проект Плану дій. Документ визначає основні шляхи досягнення цілей по скороченню енергоспоживання, скороченню викидів парникових газів та досягненню цілей щодо адаптації до наслідків змін клімату та їх пом'якшення, передбачених в рамках виконання зобов'язань Угоди мерів щодо Клімату та Енергії.

Перелік основних запланованих заходів включає термомодернізацію громадських та житлових будівель, реорганізацію транспортної системи міста, реконструкцію системи вуличного освітлення, впровадження альтернативних джерел енергії, посилення адаптаційного потенціалу громади до наслідків змін клімату, проведення інформаційних кампаній та Днів енергії.

Відповідно до вимог Угоди мерів щодо Клімату та Енергії, підготовлено та подано моніторинговий звіт про виконання Плану дій, який охоплював період по 2023 рік включно. Цей проміжний моніторинговий звіт охоплює період по 2025 рік включно та моніторинговий кадастр викидів за 2025 рік. В звіті відображено статус виконання запланованих заходів та включено додаткові заходи, що були виконані. Невиконання або відтермінування виконання деяких заходів запланованих Планом дій у звітному періоді, пов'язане з недостатністю фінансових ресурсів на їх реалізацію.

За звітний період (2021-2025 роки) на впровадження заходів з енергоефективності та адаптації до змін клімату у сферах теплопостачання, водопостачання і водовідведення, транспорту, зовнішнього освітлення, громадських і житлових будівель та озеленення витрачено 254,1 млн. грн. Зменшення викидів CO₂ за результатами впроваджених заходів за 4 роки становило 55 273,44 тон.

I. Моніторинговий кадастр викидів


Таблиця 1 – Споживання енергії по ключових секторах у 2025 році, в МВт*год

Сектор	ЗАГАЛЬНЕ СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ [МВт*год.]							ЗАГАЛОМ
	Електро-енергія	Теплова енергія/холод	Природний газ	Зріджений газ	Викопне паливо	Дизель	Бензин	Вугілля
БУДІВЛІ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОМИСЛОВІ ПІДПРИЄМСТВА								
Муніципальні будівлі, обладнання/об'єкти	1958,6	7064,4	3330,2					12353,2
Вуличне освітлення	113,3							113,3
Третинний сектор	12796,8	1745,9	6556					21098,7
Житлові будівлі	30607,8	29950,3	90560					151518,1
Промисловість	4228,30	1220						5448,3
Всього	49704,8	39980,6	100446,2					190531,6
ТРАНСПОРТ								
Комунальний транспорт				1395,1	2280			3675,1
Громадський транспорт				510,6	1451,4	637,7		2599,7
Приватний транспорт	10			39516	63610	160466,4		263602,4
Всього	10			41421,7	67341,4	161104,1		269877,2
РАЗОМ	49714,8	39980,6	100446,2	41421,7	67341,4	161104,1	400	460408,8


Таблиця 2 – Об'єми викидів CO₂ у ключових секторах у 2025 році, в тонах

Сектор	ЗАГАЛЬНЕ СПОЖИВАННЯ ЕНЕРГІЇ [МВт*год.]							ЗАГАЛОМ
	Електро-енергія	Теплова енергія/холод	Природний газ	Зріджений газ	Викопне паливо	Дизель	Бензин	Вугілля
БУДІВЛІ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОМИСЛОВІ ПІДПРИЄМСТВА								
Муніципальні будівлі, обладнання/об'єкти	1061,56	2055,74	799,25					3916,55
Вуличне освітлення	61,41							61,41
Третинний сектор	6935,87	508,06	1573,44					9017,37
Житлові будівлі	16589,43	8715,54	21734,40					47187,36
Промисловість	2291,74	355,02						2646,76
Всього	26940,01	11634,36	24107,09					62829,46
ТРАНСПОРТ								
Комунальний транспорт				379,47	820,80			1200,27
Пасажирський транспорт				138,88	522,50	200,24		861,62
Приватний транспорт	5,42			10748,35	22899,60	50386,45		84039,82
Всього	5,42	-	-	11266,70	24242,90	50586,69		86101,71
РАЗОМ	26945,43	11634,36	24107,09	11266,70	24242,90	50586,69	148	148931,17

Діаграма 1 – Порівняння споживання енергоресурсів у базовому 2007 році та 2025 році, МВт*год

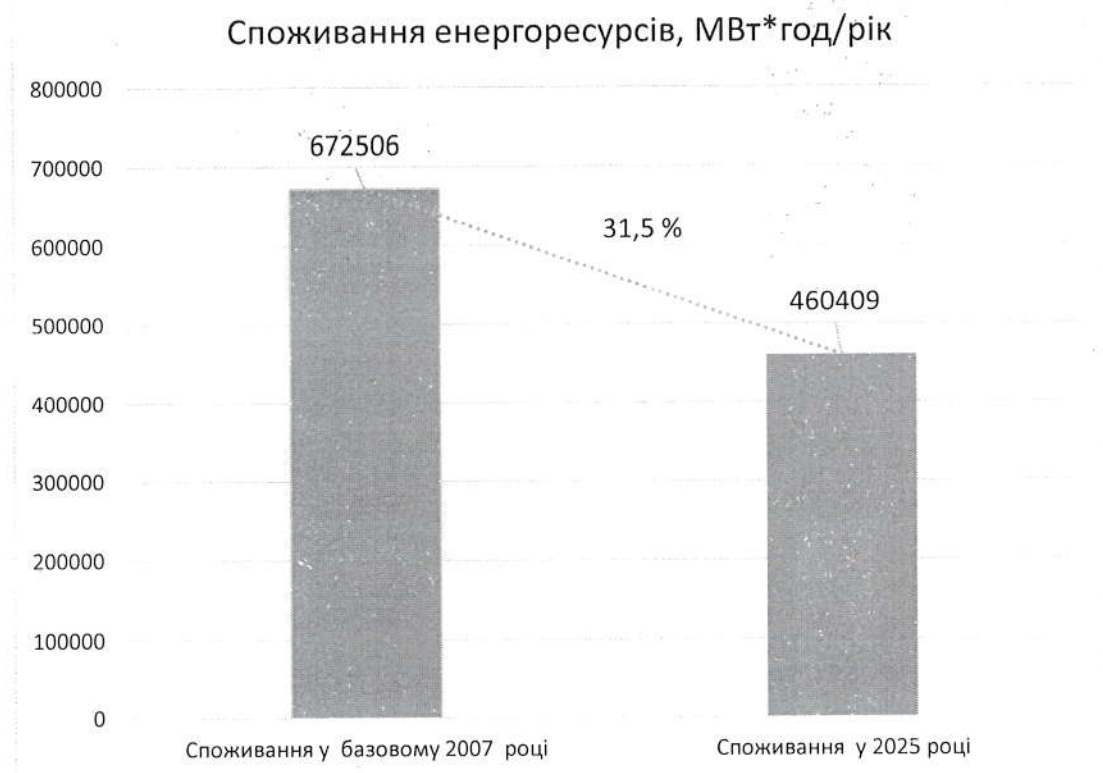

Діаграма 2 – Порівняння викидів CO₂ у базовому 2007 році та 2025 році, в тонах

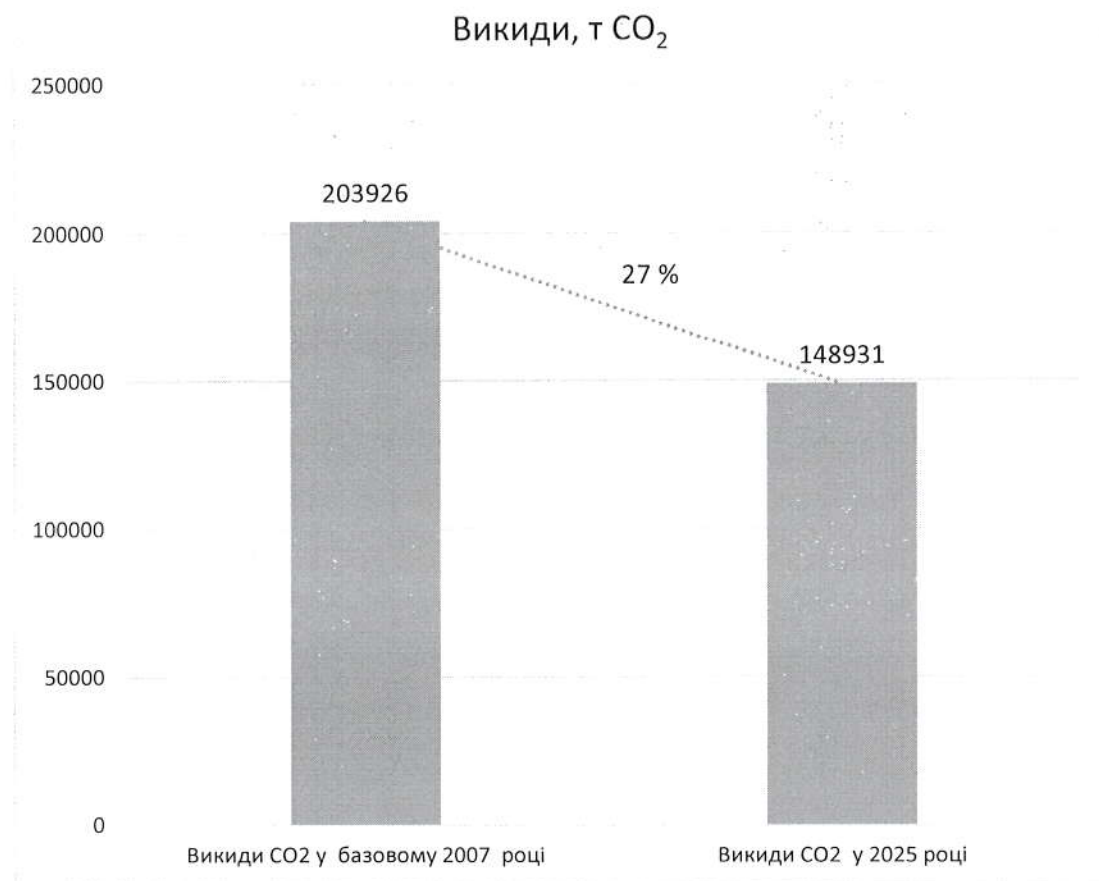

II. Опис реалізованих заходів

Для виконання ПДСЕРК Миргородської громади в Плані дій сталого енергетичного розвитку та клімату Миргородської міської територіальної громади до 2030 року було передбачено заходи у наступних секторах:


- муніципальні будівлі
- вуличне освітлення
- житлові будівлі
- транспорт
- промисловість
- адаптація до змін клімату
- енергетична бідність

Загальна вартість реалізованих заходів склала 254,1 млн. грн. Впроваджені заходи дали можливість скоротити викиди парникових газів на 55 273,44 тон CO₂.

У звітному періоді виконавчими органами ради, комунальними підприємствами та бюджетними установами проведено активну системну роботу, спрямовану на виконання заходів ПДСЕРК Миргородської громади. Зокрема, нижче наведено опис п'яти ключових заходів, що були заплановані у ПДСЕРК та реалізовані у звітному періоді:


Захід 1. Реконструкція розподільчої тепломережі від ТКЗ до ТК12 котельні по вул. Прорізній, 4а м. Миргород

На замовлення Федерального міністерства економічної співпраці та розвитку Німеччини (BMZ) та Державного секретаріату Швейцарії з економічних питань (SECO) спільно Німецьким товариством міжнародного співробітництва (GIZ) GmbH в рамках Проекту «Просування енергоефективності та імплементації Директиви ЄС про енергоефективність в Україні (FEER)» реалізовано демонстраційний проєкт «Реконструкція розподільної теплової мережі від ТК №3 до ТК №12 котельні по вул. Прорізній, 4а за адресою: вул. Д. Апостола в м. Миргороді Полтавської області». В рамках даного проєкту було виконано модернізацію тепломережі із заміни існуючих трубопроводів на трубопроводи із використанням труби сталеві попередньо ізольовані пінополіуретаном в поліетиленовій оболонці з аварійною сигналізацією протяжністю 364 м.п. у двотрубному вимірі. Прокладання модернізованої тепломережі виконувалося безканально з оптимізацією маршруту. Загальна вартість проєкту 4718,245 тис. грн, скорочення викидів CO₂ – 14,19 т./рік.

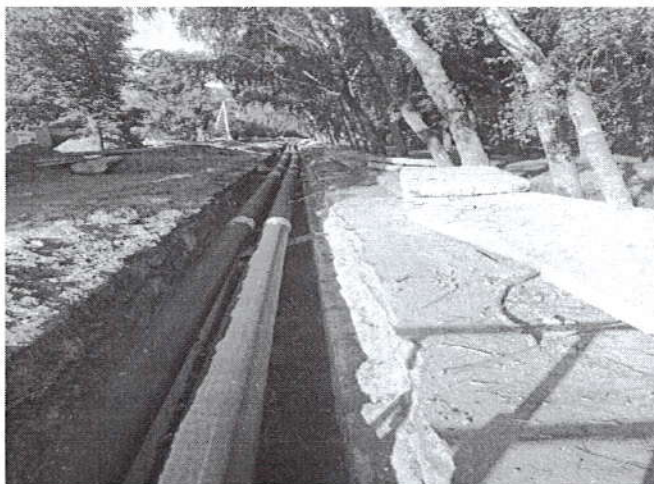


Захід 2. Будівництво наземної сонячної електростанції для КНП «Миргородська лікарня інтенсивного лікування» Миргородської міської ради

Реалізація проєкту «Будівництво наземної сонячної електростанції (для власного споживання) комунального некомерційного підприємства "Миргородська лікарня інтенсивного лікування" Миргородської міської ради за адресою вул. Гоголя, 172, м. Миргород Полтавської області» здійснювалася спільно з ГО «Еко клуб». Мета проєкту полягала в тому, щоб забезпечити лікарню власною електроенергією, виробленою на основі відновлюваних джерел енергії. В рамках даного проєкту було збудовано та підключено до мережі наземну сонячну електростанцію. Загальна потужність сонячних фотоелектричних елементів, які були встановлені, складає 37,6 кВт*год. Загальна вартість проєкту 1800,0 тис. грн, скорочення викидів CO₂ – 20 т./рік.

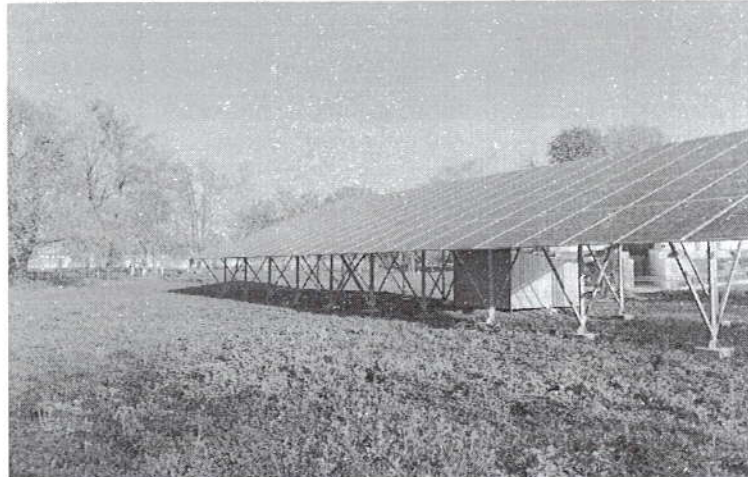

Захід 3 «Реконструкція системи електричних мереж шляхом встановлення сонячної електростанції на КП "Тепловодсервіс"»

Для уникнення кризи водопостачання та з метою уникнути серйозних перебоїв у водопостачанні міста, Миргородська міська рада разом з ГО «Еко клуб» та за підтримки міжнародної гуманітарної організації «Oxfam» реалізували проєкт «Реконструкція системи електричних мереж шляхом встановлення сонячної електростанції на комунальне підприємство "Тепловодсервіс" Миргородської міської ради». В рамках даного проєкту було збудовано та підключено гібридну сонячну електростанцію на одному із об'єктів водопостачання. Новозбудована сонячна електростанція включає в себе сонячні фотоелектричні елементи, інвертори та акумуляторну батарею. Загальна потужність сонячних фотоелектричних елементів, які були встановлені, складає 75 кВт*год, потужність встановлених двох інверторів складає 80 кВт та з 60 кВт-ною акумуляторною батареєю. Загальна вартість проєкту 3200,0 тис. грн, скорочення викидів CO₂ – 31,2 т./рік.

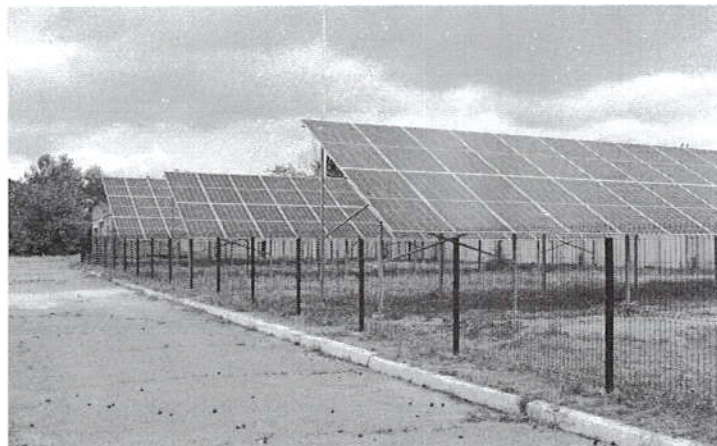

Захід 4. Створити оборотний фонд, який допоможе розв'язати упередження та побоювання мешканців щодо отримання кредитів та заохотить їх почати подавати заявки до Фонду енергоефективності.

Для подолання енергетичної бідності в громаді Миргородська міська рада разом з ГО «Екоклуб» за фінансової підтримки Федерального міністерства економіки та захисту клімату (BMWK) та Федерального міністерства охорони навколишнього середовища (AA) Німеччини реалізували проект «Створення місцевого фінансового інструменту підтримки розвитку сталої енергетики у громаді». Основною метою створення механізму є забезпечення сталого розвитку Миргородської громади через підвищення енергетичної незалежності, енергоефективності та адаптацію до сучасних енергетичних викликів. Громада прагне створити комфортні та безпечні умови для життя мешканців і розвитку підприємництва шляхом раціонального управління енергетичними ресурсами, впровадження відновлюваних джерел енергії та зменшення вуглецевого впливу на довкілля. У межах механізму передбачається надання поворотної фінансової допомоги суб'єктам малого бізнесу з метою впровадження енергоефективних рішень, розвитку зеленої енергетики та підвищення енергетичної стійкості підприємств. Бюджет револьверного фонду 900,0 тис. грн.



Захід 5. Реконструкція центру естетичного виховання

У 2022 році реалізувався проєкт «Реконструкція центру естетичного виховання за адресою: вул. Грекова 5 в м. Миргород Полтавська обл.» в рамках Надзвичайної кредитної програми для відновлення України, яка фінансується Європейським інвестиційним банком. Реалізація проєкту дала можливість реконструювати одну з найстаріших будівель міста, що є архітектурною пам'яткою та забезпечила належні умови для вихованців та викладачів закладу. Завдяки комплексній термомодернізації фасаду, даху та оновленню інженерних мереж будівлі було досягнуто значного підвищення її енергоефективності, що дозволило

суттєво скоротити споживання енергоресурсів і пропорційно зменшити обсяги викидів парникових газів CO₂ у повітряний середовище громади. Загальна вартість проєкту 29458,5 тис. грн, скорочення викидів CO₂ – 26,7 т./рік.



Секретар міської ради



Олександр ГУРЖІЙ

Handwritten signature or note in the bottom right corner.
